

Innholdsfortegnelse

K02 utredninger

K03 planlegging


K04 bygging

1

2

2

Investeringsprosjekter som Bane NOR skal gjennomføre blir styrt etter avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Dette blir avtalt i en overordnet K00 avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

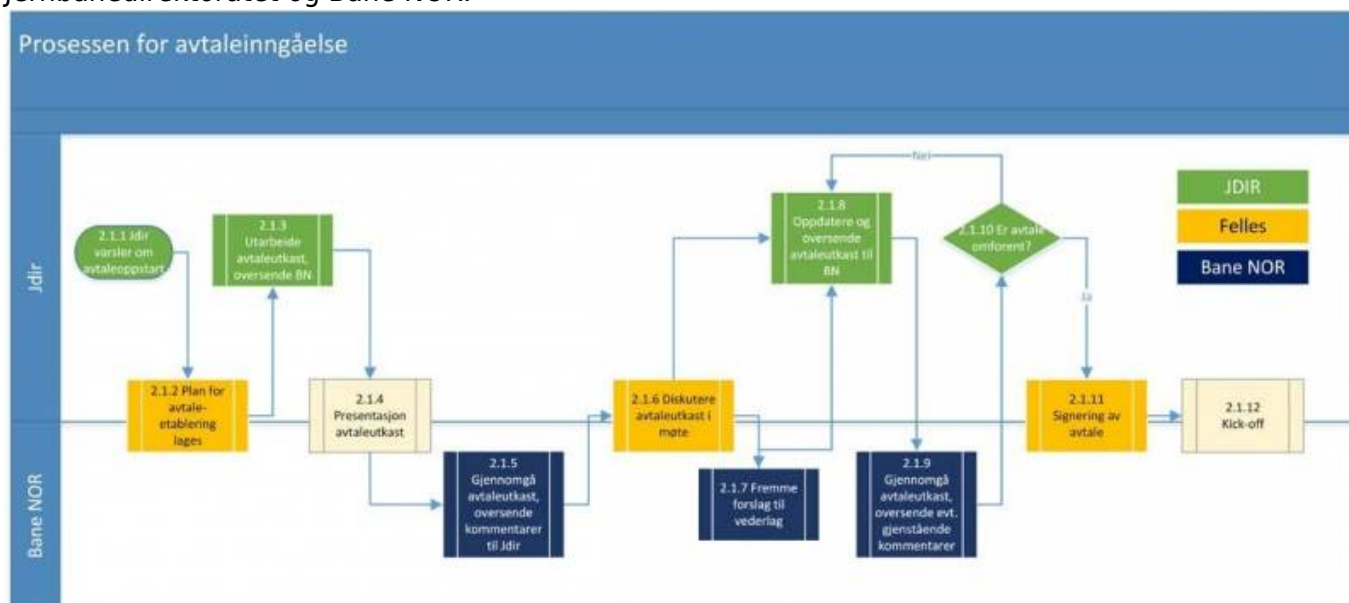


En detaljering av leveranser blir avtalt i ulike k-avtaler avhengig av oppgave:

- K01 Avtale om tilgang til eksisterende infrastruktur
- K02 Avtaler om utredninger mv
- K03 Avtaler om planlegging og prosjektering
- K04 Avtaler om bygging
- K05 Øvrige avtaler

For investeringsprosjekter så blir gjennomføringen av utredninger, planlegging, og utbygging avtalt i henholdsvis K02, K03 og K04 avtaler.

K02 utredninger

Den overordnede prosessen for bestilling og gjennomføring av utredningsoppdrag vil variere avhengig av den forventede kostnaden for tiltaket som utredes, slik figuren nedenfor viser. I det videre vil retningslinjene for inngåelse av K02-avtale, endringsmeldinger underveis og leveranse av oppdraget presiseres.

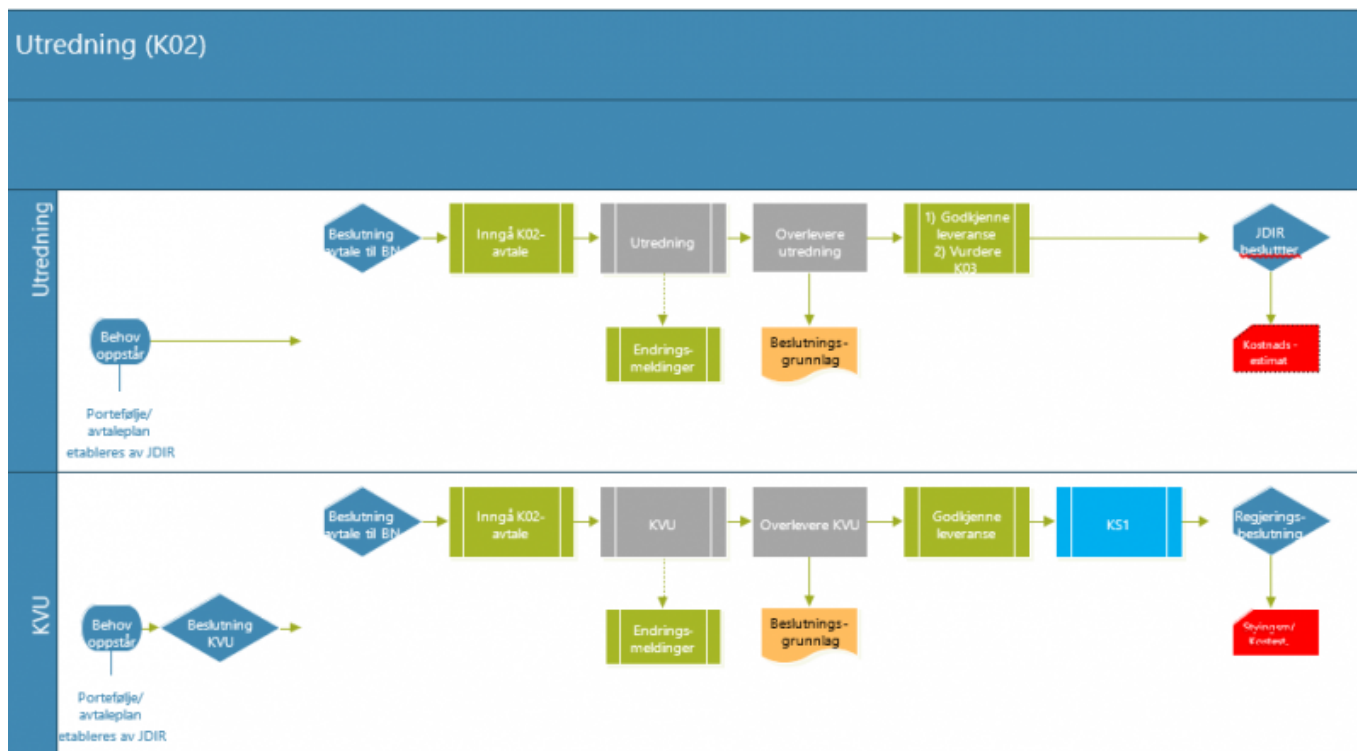

Proessen starter med en beslutning om avtaleinngåelse, som igjen baserer seg på en årlig plan for hvilke utredninger, KVUer og hovedplaner som direktoratet har til hensikt å bestille av Bane NOR.

K03 planlegging

Den overordnede prosessen for inngåelse og gjennomføring av K03-avtaler har to mulige fremgangsmåter:

- Separate avtaler for hhv. Hovedplan og Detaljplan. Direktoratet og Bane NOR inngår en K03-avtale kun for gjennomføring av hovedplan, for deretter å lage en ny K03-avtale for gjennomføring av detaljplan dersom prosjektet besluttet videreført.
- Avtale for hele planfasen. Direktoratet og Bane NOR inngår en K03-avtale for hele planfasen. Flytskjemaet nedenfor viser denne prosessen. I dette tilfellet vil det være et avsjekkspunkt når forslag til styringsmål foreligger etter hovedplan.

For prosjekter over 750 MNOK skal forslag til styringsmål behandles av regjeringen før oppstart reguleringsplan. Prosess fra styringsmål fremmes til fastsettelse må planlegges nærmere for det enkelte prosjekt, for å ikke tape tid ved fastsettelse av målet. Prosess skal være avklart i god tid før styringsmål fremmes, og normalt 6 måneder. Dersom prosjektet er under 750 MNOK skal direktoratet informeres om forslag til styringsmål, men planleggingsarbeidet fortsetter uten opphold.

K04 bygging

Den overordnede prosessen for bestilling av bygging gjennom K04-avtaler, utføring og ibruktagelse. De viktigste prosessene der begge parter involveres er selve avtaleinngåelsen, eventuelle endringsmeldinger underveis og ibrukstagelse av prosjektet.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/arbeidsprosess/k-avtaler>

Last update: **2022/01/25 07:43**
